



*COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI
SUL TERRITORIO NAZIONALE*



DOSSIER DELLE MISSIONI
RELAZIONE
RIEPILOGATIVA
ANNUALE
(MARZO 2025 > MARZO 2026)
PERFORMANCE

BONIFICA DEI 92 SITI DI DISCARICA

DI CUI AI DECRETI LEGGE DI AFFIDAMENTO:

- *DPCM 03.03.2017 “57 ABUSIVE”*
- *DPCM 22.11.2017 “22 ABUSIVE”*
- *DPDCM 05.09.2019 “ASCOLI SGL”*
- *DPCM 31.03.2021 “5 SITI PRE-ESISTENTI”*
 - *DPCM 18.02.2022 “MALAGROTTA”*
 - *DPCM 3.11.2023 “3 SITI KEU”*
- *DPCM 15.02.2024 SITO PNRR “SCORDOVILLO”*
- *DPCM 29.10.2024 SITO PNRR “VAGLIA”*

INCARICO SULLA BONIFICA DELLA AREE DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA

- *DL N.25 DEL 15.03.2025 “AREE DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA”*

PUNTO DI SITUAZIONE DELLA MISSIONE DEL COMMISSARIO UNICO PER LA BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

INTRODUZIONE

Al **Commissario Unico** per la bonifica delle discariche abusive **sono stati affidati**, in diversi momenti e con differenti atti amministrativi, **i seguenti siti** (per un **totale di 92**) **da porre in condizioni di sicurezza ambientale e/o bonificare, nello specifico** (comprensivi dei risultati), oltre ai siti compresi nell'aree delle province di Napoli e Caserta:

1. **81 siti** di discariche **abusive** da bonificare o mettere in sicurezza di cui alla **causa UE C – 196/13** del 2 dicembre 2014 (DPCM 24.03.2017, DPCM 22.11.2017 e DPCM 11.06.2019), i cui risultati specifici:
 - di cui 81 bonificati (78 espunti dalla procedura UE),
 - Sanzione ridotta da 42.8 M€ a 800.000€
 - Risparmio economico per i lavori del Commissario: su base annuale 16 M€ - su base globale dal 2017 300 M€
 - **97 % dei siti bonificati** (90% espunti dalla procedura sanzionatoria)
 - **Percentuale di performance annuale (2025-2026) sul totale della missione > 4%**
2. **5 siti** di discariche **pre-esistenti** da regolarizzare per la fase di chiusura post-mortem di cui alla **causa UE C - 498/17** (DPCM 31.03.2021):
 - di cui 4 bonificati ed espunti dalla procedura UE) ed 1 in fase conclusiva,
 - **80 % dei siti bonificati** (lavoro eseguito in 30 mesi dall'assegnazione: 03.2021 > 10.2023 – resta la regolarizzazione del sito di Salandra affidata al Commissario nel 07.2025)
 - Si sono sorpassati i contenziosi e stabilite le garanzie alla ditta che ha in carico le prestazioni lavorative (interrotte dal 2021) con atto transattivo tra le parti del dicembre 2025.
 - Le suddette opere di messa in sicurezza si sono riavviate nel mese di gennaio e sono giunte ad **una percentuale di completamento del 60%**
 - **Percentuale di performance annuale (2025-2026) sul totale della missione > 14%**
3. **1 sito** di discarica **di Roma Malagrotta** nel Comune di Roma Capitale da porre in sicurezza di cui al **pre-contenzioso UE PILOT 9068 – 16** (DPCM 18.02.2022):
 - **Siglati i contratti con gli ATI** aggiudicatori delle gare per l'adeguamento alla normativa e messa in sicurezza del sito (nuova cinturazione perimetrale e capping/trattamento biogas e percolato)
 - **Concluse le attività di studio ed indagine funzionale** alla progettazione esecutiva, in via di realizzazione dei campi base della logistica di cantiere, avviate le attività di cantierizzazione e scavo delle aree per l'esecuzione dei "campi prova"
 - **Avvio dei Piani di Alta Sorveglianza: ambientale (2025)**, prevenzione incendi (2025-26), vigilanza e sicurezza (2025-26), interconnessione e comunicazione.
 - Si sta procedendo per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)
 - concluso il procedimento finalizzato all'imposizione del vincolo preordinato all'occupazione d'urgenza, all'asservimento e/o al successivo esproprio per pubblica utilità, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e la dichiarazione di pubblica utilità e assunzione delle determinazioni con efficacia della pubblica utilità per l'occupazione d'urgenza dei 164 ettari necessari all'intervento (oltre 100 particelle catastali con i corrispondenti proprietari o esercenti diritti di interesse)
 - **contrattualizzata nell'ottobre 2025 la gestione del: Direttore dei Lavori, Direttore della sicurezza e Responsabile del progetto.**
 - **avviate le opere di adeguamento** (cinturazione esterna, capping, gestione percolato e biogas) nei mesi di ottobre e novembre 2025.
 - **31% della roadmap raggiunta sul completamento e raggiungimento degli obiettivi del mandato governativo.**
 - **Percentuale di performance annuale (2025-2026) sul totale della missione > 10%**

4. **3 siti da bonificare** collegati agli impianti di gestione rifiuti inerti “LEROSE SRL”, nel comune di **Bucine** (*Località le Valli - zona Cave*), nel comune di **Pontedera** (*località Gello Pontedera in Pisa*), nonché quello relativo al lotto V Empoli-Castelfiorentino **strada Regionale 429**, (*in Val d'Elsa nel comune di Empoli*) (DPCM 03.11.2023):
- Sono terminate le caratterizzazioni dei siti e dei relativi cumuli di rifiuti prodromiche alla progettazione degli interventi (differenti a seconda del sito, si sta procedendo a concludere la fase di progettazione esecutiva degli interventi al fine di iniziare le previste messe in sicurezza)
 - Si è proceduto all'affidamento dei lavori nei mesi di **ottobre e settembre 2025**.
 - Avviate le opere di adeguamento e bonifica dei 3 siti affidati, **concluse a febbraio 2026** le opere sul sito “strada regionale 429”, **in conclusione, entro giugno 2026**, i lavori del sito di Pontedera, avviate le fasi di progettazione degli interventi che si concluderanno entro maggio 2026, la cantierizzazione è **prevista entro settembre 2026** per il sito di Bucine.
 - **80% della roadmap raggiunta** sul completamento e raggiungimento degli obiettivi del mandato governativo.
 - **Percentuale di performance annuale (2025-2026)** sul totale della missione > **50%**
5. **1 sito da bonificare** (DPCM 15.02.2024) in località **Scordovillo** nel comune di **Lamezia Terme (CZ)** con **compiti di** “attività di redazione PDC ed analisi di rischio, progettazione definitiva/esecutiva, bonifica/messa in sicurezza permanente e lavori”:
- Validato il piano operativo di bonifica
 - Si sono avviate nel 2025 le opere di rimozione dei rifiuti superficiali e le conseguenti analisi dei suoli
 - Nel **dicembre 2025** si sono concluse le opere di rimozioni dei rifiuti in superficie
 - Nel **gennaio 2026** si sono avviate le operazioni di rimozione dei rifiuti antropici nel sottosuolo
 - Nell'**aprile 2026** si sono concluderanno tutte le operazioni e si eseguiranno le relative analisi di rischio per la verifica delle operazioni di bonifica concluse.
 - **86% della roadmap raggiunta** sul completamento
 - **100 % del raggiungimento** degli obiettivi in linea con i dettami PNRR.
 - **Percentuale di performance annuale (2025-2026)** sul totale della missione > **80%**
6. **1 sito da bonificare** (DPCM 29.10.2024) in località **Paterno** nel comune di **Vaglia (FI)** con **compiti di** “attività di revisione PDC ed analisi di rischio, progettazione definitiva/esecutiva, bonifica/messa in sicurezza permanente e lavori”:
- Si sono avviate le attività di scavo e capping delle **Area 1 e 2** (che si concluderanno entro fine aprile) realizzate le fondazioni e cordolo degli sbarramenti, concluse le impermeabilizzazioni dei fondi,
 - per l'area 3 iniziate le attività sulle barriere, la posa in opera dei riempimenti (gennaio>aprile), le sistemazioni finali, il capping e la demolizione del capannone si concluderanno entro il giugno 2026.
 - **66% della roadmap raggiunta** sul completamento e raggiungimento degli obiettivi del mandato governativo.
 - **Percentuale di performance annuale (2025-2026)** sul totale della missione > **60%**
7. **Aree da porre in sicurezza nell'ambito territoriale delle province di Napoli e Caserta** (DL nr 25 del 15.03.2025) **con compiti di** “Analisi degli interventi già effettuati e delle risorse disponibili, Perimetrazione dei siti contaminati e realizzazione delle bonifiche e messe in sicurezza, controllo sanitario della popolazione e tutela dei prodotti agricoli. Effettuare un'ampia campagna di informazione pubblica e redigere relazioni (con cadenza mensile per il primo anno di attività) sulla missione e le attività svolte.” Ecco i dati principali:
- Redazione e entrata in vigore di due Decreti Legge (DL 14.03.2025 n. 25 e DL 08.08.2025 n.116) che complementari agiscono sul sistema amministrativo e sul contrasto operativo ai fenomeni ambientali illeciti.

- Monitoraggio terreni agricoli e censimento: 957 ettari analizzati, 110 interdetti.
- Censimento dei siti di rifiuti sversati: 356 siti verificati
- Rimozione operativa dei rifiuti sversati: 2500 tonnellate (oltre 5.000 metri cubi)
- Aggiudicate gare d'appalto per rimozione siti per un valore di € 11 milioni
- Controlli delle forze di polizia: oltre 46.000
- Strutturazione di una sala operativa (h24) per monitorare gli abbandoni abusivi
- Comunicazione: 3 siti dedicati con oltre 1000 documenti on-line.
- **Percentuale di performance annuale (2025-2065) sul totale della missione > 17%**

Di seguito verranno **delineati**, per singola procedura e assegnazione, **gli andamenti ed i risultati raggiunti**.

 COMMISSARIO UNICO BONIFICHE: RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO			
	AMBITO INTERVENTO	PERFORMANCE ANNUALE (%)	STATO DI AVANZAMENTO TOTALE
1	81 SITI: Causa C-196/13	> 4%	97% (si è raggiunto il 100%, si attendono solamente le relative risposte e accettazione dei dossier)
2	5 SITI: Causa C-498/17	> 12%	80%
3	SITO DI DISCARICA DI ROMA MALAGROTTA	> 10%	31%
4	3 SITI: Le rose – rifiuto KEU (Regione Toscana)	> 50%	80%
5	LAMEZIA TERME – loc. Scordovillo (CZ)	> 50%	90%
6	VAGLIA – loc. Paterno (FI)	> 55%	66%




CAUSA C –196/13 DEL 2 DICEMBRE 2014

200 DISCARICHE ABUSIVE DI CUI **81 SITI** DI DISCARICHE COMMISSARIATI DA BONIFICARE O METTERE IN SICUREZZA

Assegnazione con DCPM 24.03.2017, DPCM 22.11.2017 e DPCM 11.06.2019

<https://www.commissariobonificadiscariche.governo.it/it/il-commissario-unico-alle-bonifiche/il-commissario/delibere-assegnazione/>

TARGET DELLA MISSIONE RAGGIUNTO: 91%

la missione commissariale affidata con **D.P.C.M. del 31.03.2017** dopo **8 anni** ha posto in condizioni di sicurezza e bonificato **81 siti**

(di cui 78 accolti dalla Ue e 3 al vaglio di validazione delle DG Envi Ue) raggiungendo così una percentuale del **100% dell'obiettivo** (96% dei siti espunti).

DETTAGLIO ANNUALE

> 3 siti messi in sicurezza ambientale e proposti alla DG ENVI della Commissione UE per la fuoriuscita dal contenzioso (2 siti di giugno 2025 e 1 a dicembre 2025);

L'Italia nel **dicembre 2014** è stata **condannata** e sanzionata dalla Corte di Giustizia Europea per la presenza sul territorio nazionale di **200 siti di discariche abusive** dopo un procedimento di infrazione iniziato nel 2003.

Ad oggi, dopo 10 anni, il nostro Paese ha bonificato o messo in sicurezza (già espunti dalla procedura UE) **197 siti** permanendone ancora **3** da espungere con la conseguente riduzione della sanzione semestrale da **€ 42.800.000,00 del dicembre 2014** agli attuali **€ 800.000,00** da corrispondere all'Unione Europea ogni sei mesi. Tutti e 3 siti rimasti sono stati proposti (nelle XXI e XXII semestralità del giugno e dicembre 2025) alla Commissione UE che opera una verifica di quanto effettuato.

Il Governo su proposta del Ministro dell'ambiente ha nominato il **24 marzo 2017** il Gen. D. CC Giuseppe Vadalà *Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale*, al quale sono stati affidati con tre successive delibere del Consiglio dei Ministri **81 siti da porre in sicurezza attraverso l'apporto di una squadra dell'Arma dei Carabinieri**, divenuto poi Commissario Unico il 31.03.2021 con apposito Decreto Legge.

Dal 24 marzo 2017 l'Ufficio del Commissario nelle sedici semestralità dal giugno 2017 al dicembre 2023 (dalla V alla XX) **ha realizzato la fuoriuscita dalla procedura di sanzione di 78 siti e la richiesta per 81** (infatti a giugno e dicembre 2025 è stata proposta l'espunzione per ulteriori 3 siti per i quali si attendono le valutazioni da parte della DG ENVI della UE) **sugli 81 assegnati originariamente.**

Nelle 16 semestralità validate dalla Ue (da giugno 2017 a dicembre 2024) e di impegno della task force dell'Arma dei Carabinieri il risparmio di penalità dell'Italia, scaturito dall'impegno della struttura commissariale (per i 78 siti già espunti dalla procedura di cui 76 contenenti rifiuti rsu e 2 contenente rifiuti speciali) è stato di **€ 16.000.000,00 su base semestrale e di € 32.000.000,00 su base annuale, nei 7 anni e mezzo (validati dalle risposte Ue) di gestione commissariale** quindi sono stati quindi risparmiati dal nostro Paese, **ben oltre € 270.000.000,00.**

Con la **regolarizzazione del sito di Chioggia** entro il dicembre 2025 si è raggiunto l'obiettivo del PNRR, (il sito andava regolarizzato entro la fine del 2026), infatti nel 2021, **33 siti** di discarica sono stati **inseriti come target nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** e nello scorso mese di novembre è stato concordato un attento cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi insieme alla D.G. PNRR del MEF e agli Organismi di Bruxelles, **di cui alla fine del 2025 si sono raggiunti tutti i 33 obiettivi complessivi.**

**Proposte alla Commissione UE per la fuoriuscita dei siti
dalla procedura di infrazione con i relativi esoneri economici nel 2025 e 2026**

- **nella 19^a semestralità - Il 02 giugno 2024**, è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la **documentazione inerente alla proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura** di infrazione di **n. 4 siti** di:
 - **n. 1** per la **Regione Marche** – Ascoli Piceno (AP) località *SGL Carbon* (rifiuti pericolosi)
 - **n. 1** per la **Regione Lazio** – Trevi (FR) località *Carpineto*;
 - **n. 1** per la **Regione Calabria** – Bianchi-Colosimi (CS) località *Colle Fratantonio*.
 - **n. 1** per la **Regione Abruzzo** – Vasto (CH) località *Vallone Maltempo*;

Il 20 gennaio 2026 è stata **comunicata la regolarizzazione di tutti e 4 siti di discarica**, posti attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari a € 1.000.000,00 semestrale e € 2.000.000,00 su base annuale**.

- **nella 20^a semestralità - Il 02 dicembre 2024**, è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la **documentazione inerente alla proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura** di infrazione di **n. 1 sito** di:
 - **n. 1** per la **Regione Calabria** – Amantea (CS) località *Grassullo*.

Il 04 marzo 2026 è stata comunicata la regolarizzazione del sito proposto, posto attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari a € 200.000,00 semestrale e € 400.000,00 su base annuale**.

- **nella 21^a semestralità - Il 02 giugno 2025**, è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la **documentazione inerente alla proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura** di infrazione di **n. 2 siti** di:
 - **n. 1** per la **Regione Campania** – Pagani (SA) località *Torretta* (*rifiuti pericolosi*)
 - **n. 1** per la **Regione Veneto** – Marghera (VE) località *Miatello*


Tale istanza **potrà portare all’espunzione** delle rispettive discariche, poste attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari ad € 600.000,00** ovvero un risparmio semestrale di € 1.200.000,00 ogni semestre.

- **nella 22^a semestralità - Il 02 dicembre 2025**, è stata inoltrata alla *Commissione Ambiente UE* la **documentazione inerente alla proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura** di infrazione di **n. 1 sito** di:
 - **n. 1** per la **Regione Veneto** – Chioggia (VE) località *Val da Rio*

Tale istanza **potrà portare all’espunzione** delle rispettive discariche, poste attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 **riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari ad € 200.000,00** ovvero un risparmio semestrale di € 400.000,00 ogni semestre.

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'		
CAUSA C 196-13		
Data	Attività	Percentuale completamento missione
2025		
gennaio	Gestione e verifica degli andamenti dei lavori del sito di Pagani e Marghera (miatello)	96%
febbraio	Collaudo delle opere di <i>Pagani</i>	
marzo	Verifica e validazione dei lavori di <i>Marghera (miatello)</i>	
giugno	Invio della richiesta di espunzione dalla procedura Ue (21^ semestralità) dei siti "sanati" di: Pagani e Marghera -Miatello	
settembre	Verifica degli andamenti delle opere di bonifica e messa in sicurezza del sito di <i>Chioggia</i>	
Dicembre	Richiesta espunzione (22^ semestralità) sito di Chioggia	100%

2026		
gennaio	La Commissione accetta i dossier inviati dal Commissario nel giugno 2024 ed espunge dalla procedura Europea di cui alla causa 196-13 i siti della XIX semestralità, ovvero: Ascoli, Trevi, Bianchi e Vasto	
marzo	La Commissione accetta il dossier inviato dal Commissario nel dicembre 2024 ed espunge dalla procedura Europea di cui alla causa 196-13 il sito della XX semestralità, ovvero: Amantea	

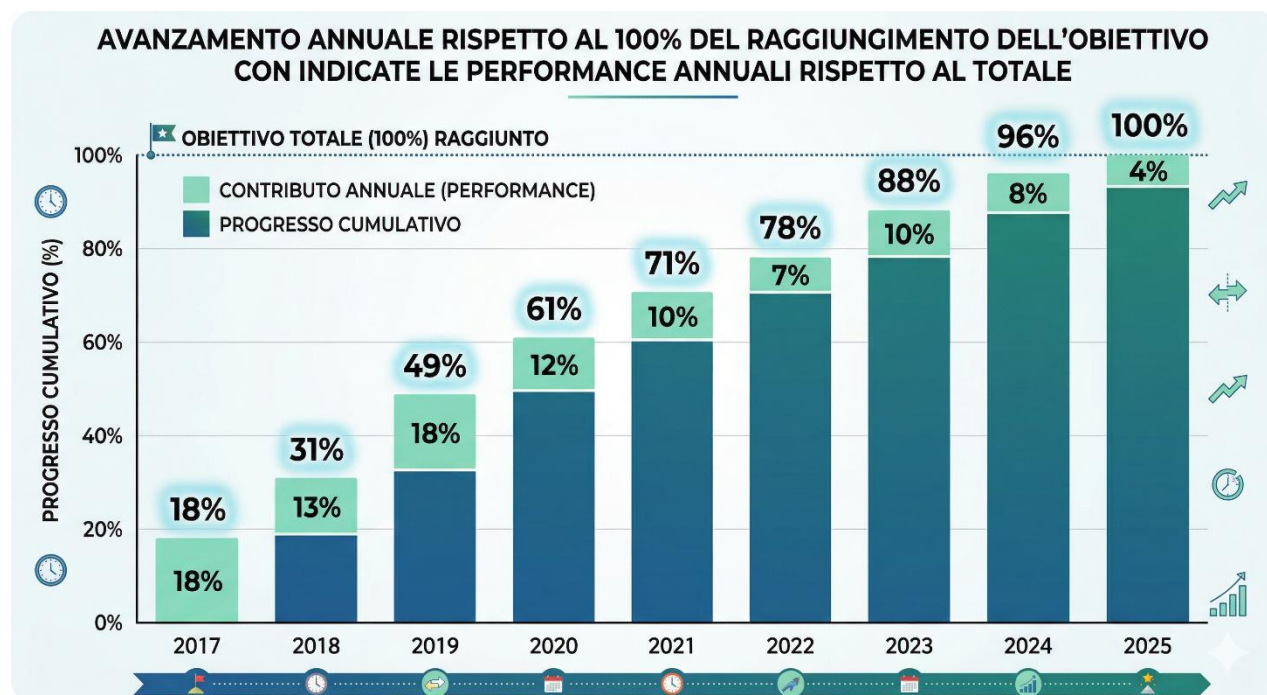

CAUSA C-498/17

DEL 21 MARZO 2017

CONTENZIOSO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA SU 44 SITI DI DISCARICHE
PREESISTENTI D CUI 5 COMMISSARIATI

DPCM 31.03.2021

4 siti: *Moliterno, Maratea, Tito e Francavilla al Mare*

DPCM 22.07.2025

1 sito: *Salandra*

Assegnazione con Dpcm del 31.03.2021 e 22.07.2025

<https://www.commissariobonificadiscariche.governo.it/it/il-commissario-unico-alle-bonifiche/nomina/delibera-pcm-31032021-assegnazione-4-discariche-causa-498-17/>

TARGET DELLA MISSIONE RAGGIUNTO: 80%

la missione commissariale affidata con **DPCM del 31.03.2021** si è conclusa i **4 siti commissariati nel 2021** e rimane da porre in sicurezza il sito di Salandra (affidato nel luglio 2025 al commissario) che si prevede di portare a compimento **entro il mese di novembre 2026**.

AVANZAMENTO ANNUALE

rispetto al 100% del raggiungimento dell'obiettivo
con indicate le *performance annuali* rispetto al totale

2021 (performance 20%)	20%
2022 (performance 50%)	70%
2023 (performance 30%)	100%

SITO DI SALANDRA

2025 (performance 20%)	20%
2026 (performance 40%)	60%

DETTAGLIO ANNUALE (marzo 2025 > marzo 26)

- > affidamento del sito nel luglio 2025
- > Conseguente analisi del contesto e del dossier
- > Avvio sinergie con Arpa e Regione
- > Verifica caratterizzazione e progetto esecutivo
- > verifica degli ostacoli con la ditta esecutrice (RTI imprese Fibro Service srl)
- > superamento dell'impasse e conseguente conferma delle garanzie alla ditta per il tramite della firma di un di protocollo transattivo tra le parti con specifico cronoprogramma delle attività
- > ripresa delle lavorazioni (riavvio cantieristica) per la messa in sicurezza

Nella procedura d'infrazione 2011/2215 – C- 498/17 relativa al mancato adeguamento e alla inefficace cessazione d'uso delle discariche (cosiddette "preesistenti") e con la prodromica entrata in vigore della direttiva 1999/31/CE, **l'Italia è stata condannata dinanzi alla Corte di Giustizia UE il 21.03.19 per 44 siti ripartite in 5 regioni: 11 in Abruzzo, 23 in Basilicata, 2 in Campania, 5 in Puglia e 3 in Friuli Venezia e Giulia.**

La sentenza di condanna della Corte di Giustizia riguarda discariche per le quali, al momento del giudizio, **non erano stati completati gli interventi di chiusura prescritte** dall'adeguamento del pacchetto di copertura nonché di altri elementi della citata. Gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria in termini di adeguamento o di chiusura delle discariche, autorizzate o in funzione al 16 luglio 2001, sono definiti dall'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE, recepito nell'ordinamento giuridico nazionale con l'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36. **Dette discariche "preesistenti" avrebbero quindi dovuto, entro i termini più volte ribaditi dalla Comunità Europea, dare attuazione a quanto previsto dalla nuova legge entrata in vigore e, nel periodo transitorio di "avvio delle procedure di regolarizzazione", porre le condizioni per la cessazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti infatti la direttiva 1999/31/CE obbligava gli Stati membri ad "adottare le misure necessarie per far chiudere al più presto" le suddette discariche preesistenti.**

In data 31.03.2021 con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (riunione del 31.03.2021) vengono affidati al Commissario Unico alle bonifiche, al fine di adeguare alla normativa vigente, 4 siti:

- **3 i siti in infrazione** commissariati nella **Regione Basilicata**:
 - Comune di Moliterno (PZ), in località *Tempa La Guarella*;
 - Comune di Maratea (PZ), in località *Montescuro*;
 - Comune di Tito (PZ), in località *Aia de' Monaci snc*.
- **1 sito in infrazione** commissariato per la **Regione Abruzzo**:
 - Comune di Francavilla al Mare (CH), in località *Valle Anzuca*;

Sulla base di analisi dettagliate e continui incontri in loco con gli organismi territoriali (Regione, comune e Arpa) si sono stabiliti, da subito, i cronoprogrammi attuativi degli interventi in piena sinergia con gli enti di riferimento locali, al fine di porre immediatamente attiva la fase operativa di adeguamento a quanto disposto dalla UE.

- Il **6 aprile 2022** è stata comunicata la **regolarizzazione di 1 sito**, inviando il dossier di adeguamento alla normativa (*determina n. 601 del 06.04.2022*) alla *Direzione Generale Environment* della UE per il tramite gerarchico, nello specifico è stata inoltrata alla *Commissione UE* la **documentazione inerente alla proposta di fuoriuscita ("espunzione") dalla procedura di: n. 1 per la Regione Basilicata – Moliterno (PZ) – località Tempa la Guarella**;
- Il **27 dicembre 2022** è stata comunicata la **regolarizzazione di 2 siti**, inviando i relativi dossier di adeguamento alla normativa (*determina n. 810 e 811 del 21.12.2022*) alla *Direzione Generale Environment* della UE per il tramite gerarchico, nello specifico è stata inoltrata alla *Commissione* la **documentazione inerente alle proposte di fuoriuscita ("espunzione") dalla procedura di: n. 1 per la Regione Basilicata – Tito (PZ) – località Aia de Monaci; n. 1 per la Regione Abruzzo – Francavilla al mare (CH) – località Valle Anzuca**;
- Il **28 ottobre 2023**, è stata comunicata la **regolarizzazione di 1 siti**, inviando il relativo dossier di adeguamento alla normativa (*determina n. 1218 del 25.10.2023*) alla *Direzione Generale Environment* della UE per il tramite gerarchico, nello specifico è stata inoltrata alla *Commissione* la **documentazione inerente la proposte di fuoriuscita ("espunzione") dalla procedura di: n. 1 per la Regione Basilicata – Maratea (PZ)- località Aia de Monaci**.

In data **22.07.2025** con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri **affida** al Commissario Unico alle bonifiche, al fine di adeguare alla normativa vigente, **1 sito**:

- **1 sito in infrazione** commissariato per la **Regione Basilicata**:
 - Comune di Salandra (MT), in località *Piana del Governo*;

Riassunto dettagliato, strutturato per punti del **contesto di riferimento e dell'azione del Commissario**:

Contesto e Oggetto dell'Appalto

- La Regione Basilicata, nel 2019, ha finanziato interventi di chiusura e adeguamento di discariche soggette a procedura di infrazione europea, tra cui quella in località "Piano del Governo" a Salandra (MT).
- Nel 2020, il Comune di Salandra ha indetto una gara per i lavori di copertura superficiale finale di tale discarica, aggiudicata nel 2021 all'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) Fibro Service Srl (Mandataria) – Semataf Srl (Mandante) per un importo di circa 2,66 milioni di euro (inclusi oneri di sicurezza) sconto del 18.6%.
- I lavori, consegnati a fine 2021, sono iniziati concretamente a febbraio 2022.

Sospensione dei Lavori e Contenzioso

- A dicembre 2022, la Direzione Lavori ha ordinato la sospensione immediata delle lavorazioni su disposizione della Regione Basilicata, richiedendo comunque la messa in sicurezza dell'area (gestione biogas e percolato).
- L'ATI ha ottenuto dal Tribunale di Matera un decreto ingiuntivo per il pagamento di Stati Avanzamento Lavori (SAL) arretrati (n. 1bis, 2, 2bis, 3, 3bis) per un totale di 1.690.300,00 euro, oltre interessi. Il Comune ha opposto il decreto, ma il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione nel luglio 2024.
- A seguito di pignoramento presso terzi, l'ATI ha riscosso una somma parziale di 365.647,62 euro nel giugno 2025.
- Nonostante una convocazione per la ripresa dei lavori a settembre 2024, firmata con riserva dall'ATI a causa del perdurante inadempimento economico, la situazione è rimasta bloccata.

Commissariamento Governativo e Accordo Transattivo

- Nel **luglio 2025**, a causa della persistente violazione delle direttive UE, il Consiglio dei Ministri ha nominato il Generale Giuseppe Vadalà Commissario unico per la bonifica della discarica di Salandra.
- **Su impulso della struttura commissariale**, e per salvaguardare l'interesse pubblico evitando ulteriori sanzioni comunitarie, le parti (Comune, ATI) alla presenza di rappresentanti regionali e commissariali, **hanno concordato un**

atto transattivo nel novembre 2025, stabilendo una riunione operativa per redigere un dettagliato cronoprogramma delle opere.

Termini dell'Accordo Transattivo L'accordo prevede un'efficacia differita nel tempo, condizionata all'adempimento di fasi progressive:

1. **Pagamenti:** Il Comune di Salandra si impegna a pagare all'ATI la somma di 1.690.300,00 euro per i SAL arretrati entro 30 giorni dalla firma, previa ricezione dei fondi dalla Regione Basilicata. Da questa somma verrà detratto quanto già riscosso tramite pignoramento (365.647,62 euro). L'ATI rinuncia agli interessi moratori maturati.
2. **Prosecuzione dei Lavori:** È prevista la redazione di una perizia di variante e la sottoscrizione di un contratto aggiuntivo per il completamento della bonifica, previo aggiornamento dei costi.
3. **Chiusura dei Contenziosi:** La rinuncia e la chiusura formale delle liti pendenti avverranno solo al momento dell'effettivo pagamento e della firma del nuovo contratto aggiuntivo (condizione sospensiva). Le spese legali saranno compensate.
4. **Termini e Condizioni dell'Accordo Transattivo** L'accordo ha efficacia differita ed è basato su clausole a formazione progressiva; il mancato rispetto di una fase caduca l'intera transazione.
5. **Ripresa e Prosecuzione Lavori:**
 1. Il Commissario ad Acta si impegna a sottoporre all'RTI una perizia di variante per il completamento dei lavori, con prezzi aggiornati al prezzario regionale 2025 e garanzia di integrale copertura finanziaria.
 2. Le parti sottoscriveranno un nuovo atto di sottomissione o contratto aggiuntivo entro 30 giorni.
 3. Vengono stabiliti termini perentori per la contabilità e i pagamenti dei futuri lavori (15 giorni per SAL/certificati + 15 giorni per mandati/accredito).
6. **Condizione Sospensiva e Chiusura Contenzioso (RG 540/2025):** La rinuncia e chiusura formale del giudizio avverranno **solo dopo** l'effettivo accredito delle somme dovute e la firma del nuovo contratto aggiuntivo. In quel momento, l'RTI rinuncerà alle domande di risoluzione contrattuale, al risarcimento danni (eccetto i crediti riconosciuti nell'accordo) e agli interessi moratori sui SAL 4 e 4bis. Le spese legali saranno compensate.
7. **Nel dicembre 2025** dopo diverse interlocuzioni e incontri si è disposta una riunione **tecnico operativa relativa alla ripresa dei lavori e alla redazione di un cronoprogramma** per organizzare tutte le lavorazioni in tempi e modalità compatibili con le varie esigenze, prima fra tutte la necessità di uscire dalla procedura di infrazione nel più breve tempo possibile.
8. **Nel gennaio 2026** si sono riprese le lavorazioni oggetto di transazione tra le parti al fine di riavviare i cantieri e proseguire con **il cronoprogramma decisivo che sancisce** la fine delle lavorazioni entro il **dicembre 2026** con collaudo per il febbraio 2027.

Cronoprogramma per l'ultimazione dei lavori di copertura finale della discarica comunale di Salandra.

Gli interventi, affidati al RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) composto da **Fibro Service Srl** e **Semataf Srl**, hanno una durata complessiva prevista di **224 giorni** (circa 7 mesi e mezzo).

Sintesi delle principali attività previste:

1. Interventi sulla Discarica e Capping

- **Completamento Copertura:** Posa del terreno vegetale sulle aree di *capping* già realizzate e completamento del "pacchetto tecnologico" sopra il telo impermeabile.
- **Regimazione Idraulica:** Realizzazione del sistema per la gestione delle acque bianche.
- **Argine di Valle:** Riprofilatura dell'argine, posa del pacchetto tecnologico e del terreno vegetale.

2. Impianti Tecnici e Sicurezza

- **Biogas:** Completamento di 3 pozzi di captazione e allestimento della relativa torcia.
- **Antincendio e Idrico:** Realizzazione dell'impianto antincendio (pressurizzazione e stoccaggio) e dell'adduttrice per l'acqua potabile.
- **Elettrico e Monitoraggio:** Installazione dell'impianto elettrico e del sistema di videosorveglianza (TVCC).

3. Opere Accessorie e Sistemazioni Esterne

- **Viabilità e Recinzioni:** Rifacimento della recinzione perimetrale, installazione di nuovi cancelli e completamento della viabilità di servizio.
- **Verde:** Realizzazione delle opere di piantumazione e sistemazione a verde.

4. Interventi Aggiuntivi (175 giorni)

Parallelamente ai lavori principali, sono previste opere strutturali specifiche:

- **Paratia di Sostegno:** Realizzazione di pali di fondazione, cordoli e muri in elevazione per l'argine di valle.
- **Opere in C.A.:** Interventi in cemento armato nell'area di ingresso.
- **Gestione Liquidi:** Sistema di intercettazione, sollevamento e stoccaggio.

Il ciclo si conclude con la pulizia finale, lo **smobilizzo del cantiere** e il ripristino delle aree entro il **prossimo ottobre 2026**.

CAUSA EU PILOT 9068-16

DISCARICA DI MALAGROTTA DI ROMA CAPITALE

DPCM 18.02.2022

Assegnazione con Decreto della Presidenza del Consiglio del 18.02.2022

<https://www.commissariobonificadiscariche.governo.it/it/il-commissario-unico-alle-bonifiche/nomina/delibera-pcm-18022022-assegnazione-malagrotta/>

TARGET DELLA MISSIONE RAGGIUNTO: 31%

Nuova cinturazione perimetrale: sono state concluse le attività di studio ed indagine funzionale al progetto esecutivo che è stato consegnato e sono state avviate le attività di cantierizzazione (comprehensive dello scavo delle aree per l'esecuzione dei "campi prova") e iniziata l'installazione delle prime barriere.

Capping, estrazione e trattamento percolato e valorizzazione biogas: sono state concluse le attività di studio ed indagine funzionale al progetto esecutivo, redatto il progetto e avviate le operazioni di cantiere nel mese di febbraio 2026

AVANZAMENTO ANNUALE

rispetto al 100% del raggiungimento dell'obiettivo
con indicate le performance annuali rispetto al totale

2022 (performance 4%)	4%
2023 (performance 4%)	8%
2024 (performance 6%)	14%
2025 (performance 10%)	24%
2026 (performance 7%)	31%

DETTAGLIO ANNUALE (marzo 2025 > marzo 26)

> **polder/cinturazione** – siglato il contratto con l'aggiudicatario, avviate le fasi di verifica e completamento delle analisi per la stesura del progetto definitivo esecutivo (realizzati oltre 100 tra pozzi e sondaggi), avviate le fasi di studio e selezione delle amalgame per l'impuntamento delle barriere idrauliche del polder. Installati i cantieri e avviate le lavorazioni previste nel gennaio 2025.

> **capping e trattamento biogas/percolato** – firmato il contratto con l'aggiudicatario, avviate le fasi di studio e analisi per la stesura del progetto esecutivo. Installati i cantieri e avviate le lavorazioni previste nel febbraio 2025.

> Avviate e concluse le fasi di esproprio per le aree di intervento comprensive delle are di accasermamento maestranze e mezzi (che sono già in fase di installazione).

> **AIA** – continuano le interconnessioni con i soggetti interessati, che concordano sui punti fondamentali, completata la redazione del dossier per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata ambientale.

Piano di Alta Sorveglianza (PAS)

> Asset di Prevenzione e interconnessione della sicurezza – allestita e attiva la control room e le torri mobili di sorveglianza del sito e delle aree limitrofe ai cantieri. Siglato il contratto con la ditta aggiudicataria del servizio che opererà nei prossimi 36 mesi.

> asset Antincendio – allestiti i mezzi antincendio e in fase di sottoscrizione il contratto con apposita società aggiudicataria della gara indetta a ottobre 2025.

> Asset Matrici Ambientali – monitoraggio e rilievo ante-corso e post operam di tutte le componenti natali collegate alle opere da realizzare: aria, suolo, acque sotterranee e dei relativi impatti potenziali derivanti (ad es. rumori, odori, emissioni in atmosfera, sversamenti.)

> **Gestione degli impianti e rapporti con la proprietà** – per il tramite di appositi incontri e protocolli con l'amministrazione giudiziaria si sono definite le linee guida e le responsabilità nonché la gestione del personale specializzato operante sul sito di discarica e sugli impianti di biogas e percolato.

> Riavviati gli impianti di gestione del biogas, di generazione dell'energia e di gestione tecnica delle manovalnze in capo al ex E.Giovi.

CHIUSURA DEL TARGET DELLA MISSIONE

In relazione a quanto stabilito dai cronoprogrammi attritativi e dal Decreto di assegnazione del 18.02.2022 si stima la chiusura della missione con il raggiungimento del target fissato dall'EU Pilot entro il **2028**

Il 18 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri su Proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Ambiente (MASE) ha deliberato l'**assegnazione al Commissario** Unico Gen. D. Giuseppe Vadalà il compito di realizzare l'adeguamento alla normativa vigente del sito di **discarica di Roma Malagrotta**.

Il cronoprogramma dettagliato e lo **stato di avanzamento delle attività** della Struttura Commissariale per l'adeguamento e la messa in sicurezza di una discarica, **nel biennio 2022-2023** si sono avviate tutte le interlocuzioni per la gestione (Prefettura, Autorità Giudiziaria, Amministrazione giudiziaria, enti locali, enti Regionali, maestranze, sindacati), la redazione dei piani operativi, la compilazione dei progetti di fattibilità, l'elaborazione dei progetti esecutivi e dei capitolari, le gare di coordinamento e di aggiudicazione degli interventi e la gestione operativa (responsabile del procedimento, direttore dei Lavori e direttore della sicurezza) per l'avvio delle opere di adeguamento previste dalla normativa. **a partire dal 2024 fino alla conclusione prevista nel 2028.**

Di seguito il riassunto strutturato per punti e annualità:

Sintesi Cronologica e Stato di Avanzamento

Anno 2024 (Avanzamento Missione: 15%)

- **Fase Iniziale (Febbraio):** Avvio delle procedure espropriative e della pianificazione per la gestione ordinaria del sito.
- **Assegnazione Lavori (Maggio):** Aggiudicazione delle gare per i due pacchetti di adeguamento e definizione delle linee guida per la progettazione esecutiva.
- **Attività Tecniche (Giugno - Novembre):** Analisi e avvio dell'installazione delle barriere idrauliche del polder (posizionamento di oltre 100 piezometri). Indizione della gara per il Piano di Alta Sorveglianza (PAS).
- **Indagini Ambientali (Luglio):** Campagna di indagini ambientali e geologiche approfondite sul sottosuolo.

Anno 2025 (Avanzamento Missione: 24%)

- **Studi e Prove (Gennaio - Febbraio):** Avvio dei campi prova per lo studio delle amalgame della barriera idraulica; studi tecnici per le aree di capping e trattamento biogas.
- **Sicurezza (Luglio):** Verifica finale e simulazione di incendio con Vigili del Fuoco e Protezione Civile.
- **Avvio Cantieri Strutturali (Agosto - Dicembre):** Esecuzione di indagini e lavori propedeutici alla costruzione del diaframma con benna. Inizio della preparazione degli impianti percolato e biogas, lavori di deviazione viabilità e rimodellamento morfologico della discarica.

Anno 2026 (Avanzamento Missione: 31%)

- **Fase Operativa Intensa:**
 - Proseguono e si intensificano i lavori di costruzione del diaframma (sia con benna che con idrofresa).
 - Avvio e monitoraggio della trincea di drenaggio a tergo del diaframma.
 - Installazione degli impianti percolato e biogas.
 - Rimodellamento morfologico e avvio dell'impermeabilizzazione di aree verdi, strade e piazzali.
 - Monitoraggio geotecnico.
- **Procedure (Febbraio - Marzo):** Aggiudicazione definitiva e firma dei contratti relativi alle gare del PAS (Antincendio, Vigilanza e Guardiania).

Anno 2027 e 2028 (Previsione Conclusiva)

- **Ultimazione Lavori (Gennaio - settembre):** Completamento della costruzione del diaframma, della trincea di drenaggio e degli impianti. Conclusione dell'impermeabilizzazione (aree strade e piazzali) e dei lavori per il pacchetto di copertura.
- **Chiusura (giugno - dicembre):** Esecuzione del collaudo finale e smobilitazione dei cantieri operativi e del campo base, segnando il completamento della missione.

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'			
Eu Pilot 9068-16 Roma Malagrotta			
Data	Attività APPALTO 1 – NUOVA CINTURAZIONE	Attività APPALTO 2 – CAPPING ED IMPIANTI	azione
2024			
(Percentuale di completamento della missione 15%)			
febbraio	la Struttura Commissariale ha avviato il percorso per la gestione delle eventuali attività ordinarie di conduzione del sito eventualmente non rientranti nel mandato ricevuto dal Governo. Avviate le comunicazioni esproprio delle parti particellari inerenti i lavori di messa in adeguamento della discarica		
Maggio	Comunicare le aggiudicazioni delle gare di selezione (avviate nel ottobre 2023) degli operatori economici per la realizzazione dei due pacchetti di adeguamento alla normativa. si è proceduto a stabilire le linee guida operative per la definizione della progettazione esecutiva e l'inizio dei cantieri dell'opera <i>de quo</i> .		eseguite
Giugno - novembre	Per l'affidamento del servizio e delle attività relative al Piano di Alta Sorveglianza è stata bandita nel giugno 2024 un'apposita procedura di gara per l'individuazione degli operatori per i servizi integrati de quo. si sono effettuate le analisi e le attività per la corretta esecuzione ed installazione delle barriere idrauliche del polder (tra le altre attività sono stati collocati oltre 100 piezometri).		eseguito
luglio	Avviata la campagna di indagini in punti dettagliati nei quali erano già emerse criticità nel passato o in punti sui quali non sembrava essere stata posta la dovuta attenzione; scopo di tale indagine ambientali è stata la ricostruzione delle caratteristiche geologiche del sottosuolo		eseguito
2025			
(Percentuale di completamento della missione 24%)			
Gennaio - febbraio	si sono avviate le operazioni per lo studio delle amalgame per la realizzazione della barriera idraulica del polder, con i campi prova che sono già attivi e prodromici all'installazione delle barriere di contenimento. Si sta procedendo inoltre alle prove tecniche e studi delle aree per la gestione e fase cantieristica del capping e trattamento del biogas.		eseguito
marzo	Avvio della stesura del bilancio sociale dei lavorino delle opere		In esecuzione
aprile	Stesura e avvio del progetto di fattibilità e gestione ambientale del sito e in relazione alle lavorazioni anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali		In esecuzione
luglio	si è proceduta alla verifica finale con conseguente simulazione di evento pericoloso di incendio con l'ausilio anche dei VV FF e protezione civile al fine di dare immediato riscontro al dispositivo posto in essere.		eseguito
Agosto	- lavori propedeutici alla costruzione del diaframma	- indagini propedeutiche alla progettazione	eseguito
Ottobre	- lavori di costruzione del diaframma con benna	- preparazione impianto percolato - preparazione impianto biogas	eseguito
Dicembre	- lavori di costruzione del diaframma con benna - deviazione viabilità'	- preparazione impianto percolato - preparazione impianto biogas - lavori rimodellamento morfologico discarica	eseguito
2026			
(Percentuale di completamento della missione 31%)			
Gennaio	- lavori di costruzione del diaframma con idrofresa - impermeabilizzazione aree verdi - deviazione viabilità'	- installazione impianto percolato - installazione impianto biogas - lavori rimodellamento morfologico discarica	eseguito
Febbraio	- aggiudicazione della gara del PAS – Antincendio - aggiudicazione della gara del PAS – vigilanza e guardiania		eseguito
marzo	- firma dei contratti per la gara del PAS (antincendio e vigilanza)		eseguito
Aprile	- lavori di costruzione del diaframma con idrofresa - lavori di costruzione del diaframma con benna - trincea di drenaggio a tergo del diaframma	- installazione impianto percolato - installazione impianto biogas - lavori rimodellamento morfologico discarica	In esecuzione
Giugno	- lavori di costruzione del diaframma con idrofresa - lavori di costruzione del diaframma con benna - monitoraggio geotecnico - trincea di drenaggio a tergo del diaframma	- installazione impianto percolato - installazione impianto biogas - lavori rimodellamento morfologico discarica	
Settembre	- lavori di costruzione del diaframma con idrofresa - lavori di costruzione del diaframma con benna	- installazione impianto percolato - installazione impianto biogas	

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'			
Eu Pilot 9068-16 Roma Malagrotta			
Data	Attività APPALTO 1 – NUOVA CINTURAZIONE	Attività APPALTO 2 – CAPPING ED IMPIANTI	azione
	- impermeabilizzazione aree strade e piazzali - monitoraggio geotecnico - trincea di drenaggio a tergo del diaframma	- lavori rimodellamento morfologico discarica	
Dicembre	- lavori di costruzione del diaframma con idrofresa - lavori di costruzione del diaframma con benna - impermeabilizzazione aree strade e piazzali - monitoraggio geotecnico - trincea di drenaggio a tergo del diaframma	- installazione impianto percolato - installazione impianto biogas - lavori rimodellamento morfologico discarica - lavori per pacchetto di copertura	
2027			
Gennaio	- lavori di costruzione del diaframma con idrofresa - lavori di costruzione del diaframma con benna - impermeabilizzazione aree strade e piazzali - trincea di drenaggio a tergo del diaframma	- installazione impianto percolato - installazione impianto biogas - lavori rimodellamento morfologico discarica - lavori per pacchetto di copertura	
Aprile ottobre	- impermeabilizzazione aree strade e piazzali - trincea di drenaggio a tergo del diaframma	- installazione impianto percolato - installazione impianto biogas - lavori rimodellamento morfologico discarica - lavori per pacchetto di copertura	
2028			
Gennaio - giugno	- collaudo	- collaudo	
Settembre	- smobilitazione dei cantieri operativi e del campo base	- smobilitazione dei cantieri operativi e del campo base	
Dicembre	- smobilitazione dei cantieri operativi e del campo base	- smobilitazione dei cantieri operativi e del campo base	

IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI INERTI

“LEROSE SRL”

3 siti in: *Bucine, Pontedera e SR 429*

Assegnazione con Decreto del Consiglio dei Ministri 03.11.2023

<https://www.commissariobonificadiscariche.governo.it/it/il-commissario-unico-alle-bonifiche/nomina/delibera-pcm-03112023-assegnazione-3-siti-toscana-keu/>

TARGET DELLA MISSIONE RAGGIUNTO: 36%

Si sta procedendo alla verifica dei possibili scenari per la bonifica e messa in sicurezza delle aree (tutti e 3 i siti sono stati caratterizzati con le relative matrici ambientali ed analisi di rischio)

AVANZAMENTO ANNUALE

rispetto al 100% del raggiungimento dell'obiettivo
con indicate le performance annuali rispetto al totale

2023 (performance 6%)	6%
2024 (performance 12%)	18%
2025 (performance 28%)	46%
2026 (performance 38 %)	80%

DETTAGLIO ANNUALE (marzo 2025 > marzo 26)

Nel 2025/26 si sono concluse le opere di caratterizzazione dei siti e dei relativi cumuli di rifiuto nonché le pertinenti analisi di rischio, comprensive dell'approvazione in conferenza dei servizi dei risultati. Si sono aggiudicate le gare per l'affidamento delle opere, e si sono avviati i cantieri per 2 dei siti (Pontedera e strada provinciale), le cui opere sono terminate nel febbraio 2026 per il sito “strada regionale 429” e termineranno entro la fine di maggio 2026 per il sito di Pontedera. Per il sito di Bucine si sta redigendo il progetto e si avvieranno i cantieri entro il mese di settembre 2026.

CHIUSURA DEL TARGET DELLA MISSIONE

In relazione a quanto stabilito dai cronoprogrammi attuativi si stima la chiusura della missione con il raggiungimento delle complete bonifiche (1 già concluso) dei tre siti **Luglio 2027**

Il **3 novembre 2023** il Consiglio dei Ministri su Proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Ambiente (MASE) ha deliberato l'**assegnazione al Commissario** Unico Gen. D. Giuseppe Vadalà il compito di realizzare il prosieguo delle **attività di bonifica dei 3 siti** collegati agli impianti di gestione rifiuti inerti “LEROSE SRL”: nel Comune di **Bucine (AR)**, nel comune di **Pontedera (PI)** e la **strada regionale ss 246**.

Sunto dei punti principali relativi all'intervento

presso l'impianto di rifiuti inerti "Lerose S.r.l." nel comune di **Bucine (AR)**

Stato dell'Arte - Attualmente è in corso la redazione del progetto esecutivo per la Messa in Sicurezza Permanente (MISP), seguendo le linee guida già approvate nella Conferenza dei Servizi del maggio 2025.
Cronoprogramma delle attività.

Il piano prevede **tre scadenze principali**:

- **Maggio 2026:** Conclusione della fase progettuale (compresa approvazione e validazione).
- **Settembre 2026:** Affidamento e consegna dei lavori.
- **Luglio 2027:** Fine della fase esecutiva dei lavori (escluso il collaudo).

Attività completate (Stato: ESEGUITO)

Sono state già concluse con successo le fasi preliminari e d'indagine:

1. **Indagini e Analisi:** Affidamento servizi, esecuzione dei campionamenti geognostici e analisi chimiche di laboratorio.
2. **Documentazione Tecnica:** Approvazione del Piano Operativo d'indagine, redazione del report sui rifiuti e dell'Analisi di Rischio.
3. **Inizio Progettazione:** L'incarico per la progettazione è già stato affidato.

Attività in corso e future (IN ESECUZIONE)

- **In corso:** Redazione del progetto operativo di bonifica/MISP.
- **Prossimamente:** Indizione della gara d'appalto per i lavori (settembre), nomina della Direzione Lavori (DLL) e successiva fase di cantierizzazione (ottobre), conclusione delle opere (luglio 2027).

Descrizione attività		entro il	Stato attuazione
Fase di affidamento indagini, analisi e servizio professionale	Invito a formulare l'offerta agli OE selezionati (affidamento diretto con consultazione di 5 operatori)		ESEGUITO
	Ricezione delle offerte		ESEGUITO
	Valutazione offerte		ESEGUITO
	Verifiche di legge sul concorrente selezionato		ESEGUITO
	Consegna servizi d'indagine, analisi e ingegneria/ Avvio attività		ESEGUITO
Fase preliminare	Redazione Piano Operativo d'indagine, prelievo e analisi rifiuti	Documenti approvati in sede di CdS del 13.05.2025	ESEGUITO
	Realizzazione indagini geognostiche		ESEGUITO
	Campionamento e invio dei campioni in laboratorio		ESEGUITO
	Esecuzione analisi chimiche di laboratorio e trasmissione risultati		ESEGUITO
	Redazione report dei risultati del Piano Operativo d'indagine, prelievo ed analisi dei rifiuti		ESEGUITO
	Redazione Analisi di Rischio		ESEGUITO
Fase progettuale	Affidamento incarico progettazione	31.05.26	ESEGUITO
	Redazione progetto operativo di bonifica/MISP		IN ESECUZIONE
	Conferenza dei servizi		
	Approvazione progetto e trasmissione del decreto agli stakeholders		
	Verifica e validazione		
Fase di affidamento dei lavori	Pubblicazione Bando o invito a formulare l'offerta agli OE selezionati (procedura aperta o negoziata con inversione procedimentale)	30.09.26	
	Ricezione delle offerte		
	Valutazione tecnica offerte		
	Apertura busta economica e temporale		
	Graduatoria di gara		
	Valutazione documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria		
	Verifiche di legge sul primo concorrente in graduatoria		
	Aggiudicazione e consegna dei lavori sotto riserva di legge		
Fase di affidamento DLL	Nomina ufficio DLL/CSE con supporti specialistici	30.09.26	
Fase esecutiva	Esecuzione dei lavori	31.07.27	

**Sunto dei punti principali relativi all'intervento
presso l'impianto di rifiuti inerti "Lerose S.r.l." nel comune di Pontedera (PI)**

Stato dell'Intervento - Il servizio è affidato all'**ATI Ireos S.p.A. (Mandataria)** e **Hexa Green S.r.l. (Mandante)**. I lavori, avviati a settembre 2025, sono attualmente **in corso** con uno stato di avanzamento di circa l'**80%**.

Cronoprogramma: **Conclusione prevista entro il 31 maggio 2026.**

Attività Completate (ESEGUITE)

Tutte le fasi propedeutiche sono state concluse con successo:

- **Fase Preliminare:** *ottobre 2024/gennaio 2025* - Indagini geognostiche, campionamenti, analisi chimiche di laboratorio e redazione del Piano di Rimozione Rifiuti (PRR).
- **Fase Progettuale:** *febbraio/giugno 2025* - Redazione, approvazione, verifica e validazione del progetto operativo di bonifica.
- **Fase di Affidamento:** *settembre 2025* - Conclusione dell'iter di gara (pubblicazione bando, valutazione offerte, verifiche di legge) e aggiudicazione/consegna dei lavori.
- **Direzione Lavori:** *ottobre 2025* - Nomina dell'ufficio DLL/CSE con i relativi supporti specialistici.

Fase Attuale (IN ESECUZIONE)

- **Fase Esecutiva:** sono in corso le attività di bonifica dei suoli e delle bag contenenti il rifiuto spciale nonché la messa in sicurezza delle aree e delle falde.

Descrizione attività		entro il	Stato attuazione
Fase preliminare	Redazione Piano Operativo d'indagine, prelievo e analisi rifiuti		ESEGUITO
	Realizzazione indagini geognostiche		ESEGUITO
	Campionamento e invio dei campioni in laboratorio		ESEGUITO
	Esecuzione analisi chimiche di laboratorio e trasmissione risultati		ESEGUITO
	Redazione report dei risultati del Piano Operativo d'indagine, prelievo ed analisi dei rifiuti		ESEGUITO
	Redazione Piano di Rimozione Rifiuti		ESEGUITO
	Tavolo tecnico con gli enti per la condivisione dei risultati del Piano Operativo d'Indagine e del PRR		ESEGUITO
Fase progettuale	Redazione progetto operativo di bonifica		ESEGUITO
	Approvazione progetto, verifica e validazione		ESEGUITO
Fase di affidamento dei lavori	Pubblicazione Bando o invito a formulare l'offerta agli OE selezionati (procedura aperta o negoziata con inversione procedimentale)		ESEGUITO
	Ricezione delle offerte		ESEGUITO
	Valutazione tecnica offerte		ESEGUITO
	Apertura busta economica e temporale		ESEGUITO
	Graduatoria di gara		ESEGUITO
	Valutazione documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria		ESEGUITO
	Verifiche di legge sul primo concorrente in graduatoria		ESEGUITO
	Aggiudicazione e consegna dei lavori		ESEGUITO

Fase di affidamento DLL	Nomina ufficio DLL/CSE con supporti specialistici		ESEGUITO
Fase esecutiva	Esecuzione dei lavori	31.05.26	IN ESECUZIONE

**Sunto dei punti principali relativi all'intervento
presso la strada regionale 429 nel comune di Empoli (FI)**

Stato dell'Intervento - L'intervento di **Messa in Sicurezza Permanente (MISP)** è ufficialmente **concluso**, con il completamento della fase esecutiva avvenuto nel mese di **febbraio 2026**.

Attività in Corso (IN ESECUZIONE)

- **Monitoraggio Ambientale:** È attualmente in fase di **affidamento** l'incarico per il monitoraggio delle acque sotterranee.
- **Dettagli:** Il monitoraggio avrà cadenza semestrale e una durata complessiva di **cinque anni**, come stabilito dalla Determinazione comunale n. 478 del 24/04/2025.

Attività Completate (ESEGUITE)

L'intero iter procedurale e operativo risulta finalizzato:

- **Fase Progettuale:** ottobre 2024 / gennaio 2025 Redazione, conferenza dei servizi, approvazione e validazione del progetto MISP.
- **Fase di Affidamento:** febbraio/marzo 2025 Svolgimento della gara d'appalto (ex D.Lgs. 36/2023), valutazione delle offerte e verifiche di legge.
- **Direzione Lavori:** settembre/ottobre 2025 - Nomina dell'ufficio DLL/CSE e dei supporti specialistici.
- **Fase Esecutiva:** novembre /febbraio 2026 - Esecuzione materiale dei lavori giunta al termine.

Descrizione attività		entro il	Stato attuazione
Fase progettuale	Redazione progetto operativo di MISP		ESEGUITO
	Conferenza dei servizi		ESEGUITO
	Approvazione progetto e trasmissione del decreto agli stakeholders		ESEGUITO
	Verifica e validazione		ESEGUITO
Fase di affidamento dei lavori	Pubblicazione gara ex art.50 comma 1 lett. c) del D.Lgs.36/2023 con massimo ribasso o economicamente più vantaggiosa		ESEGUITO
	Ricezione delle offerte		ESEGUITO
	Valutazione tecnica offerte		ESEGUITO
	Apertura busta economica e temporale		ESEGUITO
	Graduatoria di gara		ESEGUITO
	Valutazione documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria		ESEGUITO
	Verifiche di legge sul primo concorrente in graduatoria		ESEGUITO
	Aggiudicazione e consegna dei lavori sotto riserva di legge		ESEGUITO
Fase di affidamento DLL	Nomina ufficio DLL/CSE con supporti specialistici		ESEGUITO
Fase esecutiva	Esecuzione dei lavori		ESEGUITO

Lamezia Terme (CZ)

Località Scordovillo

Assegnazione con Decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.02.2024

<https://www.commissariobonificadiscariche.governo.it/it/il-commissario-unico-alle-bonifiche/nomina/delibera-pcm-15022024-assegnazione-sito-di-lamezia-terme-discardica-scordovillo/>

TARGET DELLA MISSIONE RAGGIUNTO: 90%

La rimozione dei rifiuti superficiali come previsto da progettazione e obiettivo Pnrr si è conclusa nel **dicembre 2025**

AVANZAMENTO ANNUALE

rispetto al 100% del raggiungimento dell'obiettivo
con indicate le performance annuali rispetto al totale

2024 (performance 15%)	15%
2025 (performance 50%)	85%
2026 (performance 5%)	90%

DETTAGLIO ANNUALE (marzo 2025> marzo 26)

> Nel corso del **2025** si sono avviate le operazioni di pulizia delle aree, con la conseguente rimozione totale dei rifiuti in superficie, si sono altresì effettuate le previste analisi dei luoghi per determinare l'efficacia dell'intervento, si sono poi avviate le rimozioni sottosuolo dei rifiuti antropici le quali termineranno entro il mese di **aprile 2026**.

CHIUSURA DEL TARGET DELLA MISSIONE

In relazione a quanto stabilito dai cronoprogrammi attritativi e dal Decreto di assegnazione del 15.02.2024 si stima la chiusura della missione con il raggiungimento del target fissato dal Pnrr entro il mese di **giugno 2026**

CRONOPROGRAMMA DI DETTAGLIO

Il **15 febbraio 2024** il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) Gilberto Pichetto Fratin, ha **deliberato l'attribuzione al Commissario Unico**, Generale dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, il compito di realizzare le attività di bonifica del sito di discarica del comune di **Lamezia Terme, località Scordovillo**, sito orfano che risulta inserito nella misura **PNRR M2C4 I 3.4**.

Inserito già nei siti abbinabili di bonifica (siti orfani censiti MASE con DM 4.08.2022), per i 10.400 mq di Scordovillo (GURI n.239 del 12.10.2022) si dispone al Commissario di redigere un Piano di caratterizzazione, la conseguente Analisi di Rischio, la progettazione definitiva/esecutiva nonché la Bonifica/messa in sicurezza permanente, per tali lavori si è proceduto a stanziare 8 milioni di euro che secondo la normativa di assegnazione transiteranno in contabilità speciale intestata al Commissario.

Sunto dello stato dell'intervento presso il sito orfano "Loc. Scordovillo" a Lamezia Terme (CZ):

- **Stato dell'intervento principale:** Il servizio di **rimozione dei rifiuti in superficie**, affidato all'*ATI Ecosistem S.r.l. - Serveco S.r.l.*, si è **concluso nel mese di dicembre 2025**. Tutte le fasi propedeutiche (*progettazione, conferenza dei servizi, affidamento lavori e direzione lavori*) e l'esecuzione dei lavori principali risultano **ESEGUITE**.
- **Attività in corso:** È attualmente **in fase di esecuzione** un'attività integrativa per la rimozione di rifiuti antropici presenti nel **sottosuolo**.
- **Cronoprogramma futuro:** La conclusione di questa attività integrativa nel sottosuolo è prevista **entro il mese di aprile 2026**.

Descrizione attività		entro il	Stato attuazione
Fase progettuale	Redazione Piano di Caratterizzazione		ESEGUITO
	Progetto di Bonifica		ESEGUITO
	Conferenza dei servizi		ESEGUITO
	Approvazione progetto e trasmissione del decreto agli stakeholders		ESEGUITO
	Verifica e validazione		ESEGUITO
Fase di affidamento dei lavori	Pubblicazione gara ex art.50 comma 1 lett. c) del D.Lgs.36/2023 con massimo ribasso o economicamente più vantaggiosa		ESEGUITO
	Ricezione delle offerte		ESEGUITO
	Valutazione tecnica offerte		ESEGUITO
	Apertura busta economica e temporale		ESEGUITO
	Graduatoria di gara		ESEGUITO
	Valutazione documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria		ESEGUITO
	Verifiche di legge sul primo concorrente in graduatoria		ESEGUITO
	Aggiudicazione e consegna dei lavori sotto riserva di legge		ESEGUITO
Fase di affidamento DLL	Nomina ufficio DLL/CSE con supporti specialistici		ESEGUITO
Fase esecutiva	Esecuzione dei lavori		ESEGUITO
	Esecuzione attività integrativa di rimozione rifiuti nel sottosuolo		IN ESECUZIONE

Vaglia (FI)

Località Paterno

Assegnazione con Decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.10.2024

<https://www.commissariobonificadiscariche.governo.it/it/siti-commissariati-91-siti/siti-di-discarda-commissariati/discarda-di-cava-paterno-in-localita-vaglia-fi/>

TARGET DELLA MISSIONE RAGGIUNTO: 65%

*Bonificate e messe in sicurezza le Aree 1 e 2 in fase di conclusione (marzo-maggio),
la bonifica dell'area 3 entro il luglio 2026*

AVANZAMENTO ANNUALE

**rispetto al 100% del raggiungimento dell'obiettivo
con indicate le performance annuali rispetto al totale**

2024 (performance 4%)	4%
2025 (performance 55%)	59 %
2026 (in corso – performance 16%)	66 %

CHIUSURA DEL TARGET DELLA MISSIONE

In relazione a quanto stabilito dai cronoprogrammi attritativi e dal Decreto di assegnazione del 29.10.2024 si stima la chiusura della missione con il raggiungimento del target fissato dal Pnrr (70% del totale) entro il mese di **giugno 2026**

DETTAGLIO ANNUALE (marzo 2025 > marzo 2026)

Si sono avviate le attività di scavo e capping delle Area 1 e 2 (che si concluderanno entro fine aprile) realizzate le fondazioni e cordolo degli sbarramenti, concluse le impermeabilizzazioni dei fondi, per l'area 3 iniziate le attività sulle barriere, la posa in opera dei riempimenti (gennaio>aprile), le sistemazioni finali, il capping e la demolizione del capannone si concluderanno entro il giugno 2026, con chiusura degli interventi finali e rendicontazione nel Luglio 2026.

CRONOPROGRAMMA DI DETTAGLIO

Il 18 giugno 2024 la Regione Toscana ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di nominare il Generale dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, attuale Commissario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche abusive, quale soggetto attuatore dell'intervento di "Completamento della caratterizzazione dei rifiuti presenti, progettazione di messa in sicurezza permanente (MISP)/bonifica ed esecuzione degli interventi", previsto dalla misura PNRR M2C4, I3.4 sul sito orfano denominato "Ex cava Paterno", nel Comune di Vaglia (FI).

Il 29 ottobre 2024 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha deliberato l'attribuzione al Generale Vadalà, **l'incarico di soggetto attuatore dell'intervento in sostituzione del Comune di Vaglia**, impossibilitato ad ottemperare per la sopraggiunta indisponibilità di personale che garantisca la corretta esecuzione del procedimento ed **il rispetto dei tempi dettati dalla linea di finanziamento di euro 6.250.000.**

Nel **dicembre 2024** si sono ricevute gli esiti della caratterizzazione avviata nel 2023. Nel **gennaio 2025** si sono avviate le prime indagini integrative sui cumuli di rifiuti. Nel mese di **febbraio 2025** si è siglato il protocollo attuativo a tre (MASE, Commissario, Regione Toscana) per la gestione dei fondi finanziari e la rendicontazione degli stessi. Nel mese di **marzo 2025** è stato definito il modello concettuale definitivo del sito e delle matrici

ambientali che consenta l’acquisizione di ogni elemento utile per una ponderata valutazione dei costi e dei benefici con riferimento agli interventi da mettere in atto in una prossima fase.

Nel mese di **aprile 2025** è stato sottoscritto il protocollo con Veneto Acque per lo svolgimento dell’attività di Stazione Appaltante e Responsabile Unico del Progetto nelle procedure economiche ed è stato acquisito il parere Arpat “Valutazioni tecniche sulle indagini integrative al piano di caratterizzazione”, che giudica positivamente la proposta del Commissario salvo integrazioni accolte ed inserite negli elaborati operativi.

Nel mese di **maggio 2025** sono iniziate le attività di campo per le indagini integrative con presenza ARPAT per prelievo campioni di matrici ambientali. A **giugno 2025** si sono concluse le attività di campo per le indagini integrative, in contraddittorio con Arpat.

Il cronoprogramma dei lavori di Messa in Sicurezza Permanente (MISP).

L'intervento ha una **durata complessiva stimata in circa 160 giorni**, con inizio il **1° dicembre 2025** e conclusione prevista per il **10 luglio 2026**.

Di seguito il riassunto delle **fasi principali** e delle **scadenze chiave**:

1. Fasi Preliminari e Area Sommitale

- Attività preliminari: Dal 01/12/25 al 19/12/25.
- Lavorazioni parte sommitale: Iniziano il 10/12/25 e includono la rimozione dei rifiuti, il collaudo e la realizzazione dei sistemi di regimazione idraulica (conclusione entro fine gennaio 2026).

2. Interventi nelle Macro-Aree (1, 2 e 3)

Il cuore del progetto riguarda la gestione delle tre aree operative:

- AREA 1: Scavo e spostamento dei materiali nell'Area 2 (dal 10/12/25 al 13/01/26).
- AREA 2 (Sud e Nord): Rappresenta la fase più lunga. Include la realizzazione del capping (copertura impermeabile) divisa tra zona Nord (fino a febbraio 2026) e zona Sud (fino a metà marzo 2026), oltre alla regimazione idraulica finale entro il 31/03/26.
- AREA 3: Allestimento e impermeabilizzazione della vasca (barriera in argilla e rete drenaggio percolato) tra febbraio e aprile 2026.

3. Opere Strutturali e Impiantistiche


- Sbarramento e fondazioni: Realizzazione di opere in cemento armato e cordoli tra dicembre 2025 e gennaio 2026.
- Gestione Percolato: Costruzione di un bacino di contenimento in C.A. e installazione di serbatoi e tubazioni (piping) tra febbraio e aprile 2026.

4. Chiusura e Ripristino (Fase Finale)

Le ultime lavorazioni si concentreranno tra maggio e luglio 2026:

- Riempimento e Capping finale: Gestione dei rifiuti residui nell'Area 3 e relativa copertura.
- Demolizioni e Opere Accessorie: Abbattimento del capannone esistente, realizzazione di una gabbionata e completamento delle canalette.
- Conclusione: Il ripristino ambientale e le sistemazioni finali termineranno il 10 luglio 2026.

Schema Cronoprogramma ATTIVITA'

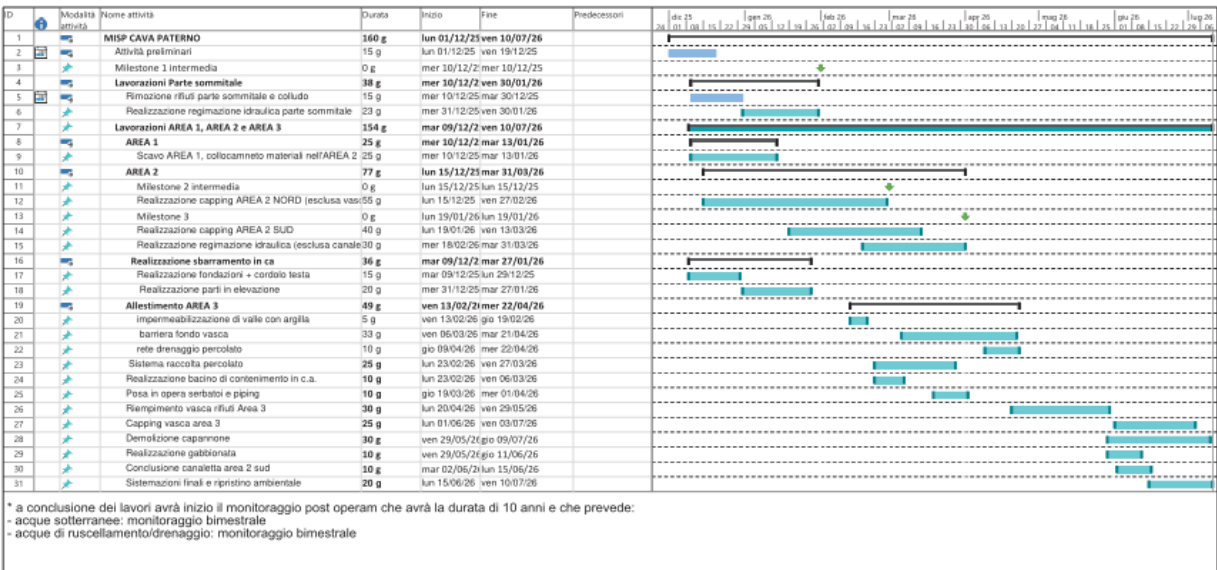

Aree delle province di Napoli e Caserta

Assegnazione con Decreto Legge n. 25 del 15.03.2025

<https://www.commissariobonificadiscariche.governo.it/it/siti-commissariati/siti-di-discardica-commissariati/siti-contaminati-province-di-napoli-e-caserta/>

TARGET DELLA MISSIONE RAGGIUNTO: 17%

Avviate caratterizzazioni dei siti, rimossi 2500 ton di rifiuti superficiali, aggiudicate le gare della rimozione e caratterizzazione, oltre 20.000 controlli oncologici mensili, 1500 ettari di terreni agricoli a rischio in corso di indagini, 46000 controlli delle forze di polizia

AVANZAMENTO ANNUALE

**rispetto al 100% del raggiungimento dell'obiettivo
con indicate le performance annuali rispetto al totale**

2026 (in corso – performance 17%)	17 %
-----------------------------------	------

Il **15 marzo 2025** la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha **deliberato con Decreto Legge nr 25 l'attribuzione al Commissario Unico**, i compiti di *Analisi degli interventi già effettuati e delle risorse disponibili, Perimetrazione dei siti contaminati e realizzazione delle bonifiche e messe in sicurezza, controllo sanitario della popolazione e tutela dei prodotti agricoli. Effettuare un'ampia campagna di informazione pubblica e redigere relazioni (con cadenza mensile per il primo anno di attività) sulla missione e le attività svolte.*

La presente relazione **illustra i risultati conseguiti dalla direzione commissariale nell'arco dell'ultimo anno**, evidenziando un cambio di passo decisivo nella tutela del territorio e nella legalità delle operazioni di bonifica.

I dati testimoniano un impegno trasversale della Cabina di Regia (presieduta dal Sottosegretario Mantovano e con vertice del Viceministro Gava) **che coniuga l'efficacia operativa sul campo, una rigorosa disciplina economica e una costante trasparenza istituzionale.**

Il bilancio dell'anno trascorso evidenzia come la Struttura Commissariale non si sia **limitata alla gestione dell'emergenza, ma abbia instaurato un modello organizzativo integrato**: combinazione di bonifica ambientale, tutela della salute, rigore economico e contrasto attivo ai reati ambientali, fattori che **delineano un percorso di ripristino della legalità, della sicurezza territoriale e del risanamento ambientale ormai consolidato anche dalle esperienze pregresse.**

Riepilogo che delinea **l'evoluzione normativa e operativa per il contrasto all'inquinamento nelle aree delle province di Napoli e Caserta** (la cosiddetta "*Terra dei Fuochi*").

Contesto storico e criticità

Dagli anni '70 e '80, vaste aree tra Napoli e Caserta (*90 Comuni, 150.000 ettari, 2,6 milioni di abitanti*) sono teatro di **smaltimento illegale di rifiuti**.

Questa circostanza ha causato nel tempo:

- contaminazione di terreni e acque sotterranee.
- inquinamento atmosferico riconducibile ai **roghi tossici**.
- gravi rischi per la salute pubblica e la sicurezza agroalimentare.

Evoluzione normativa e la condanna CEDU

- **Origini (2013)**: Lo Stato, per contrastare in fenomeno, interviene con il D.L. 136/2013 che ha l'obiettivo di mappare i terreni agricoli interessati e avviarne le bonifiche.
- **La sentenza (2025)**: Il 30 gennaio 2025, la **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)** condanna l'Italia per la violazione del diritto alla vita (Art. 2), imponendo misure risolutive da porsi in essere entro due anni.
- **Risposta del Governo (2025)**: Vengono emanati nuovi decreti (D.L. 25/2025 e D.L. 116/2025) **finalizzati a rafforzare in modo significativo il ruolo del Commissario unico per le bonifiche, e introdurre misure**

Commissario Unico alle Bonifiche delle discariche

DOSSIER *performance annuale – 2025>26*

urgenti per il contrasto ai reati in materia di rifiuti, con il rafforzamento delle bonifiche (in particolare nella Terra dei Fuochi) e la tutela della salute pubblica:

- il **D.L. 14 marzo 2025, n. 25** (conv. in L. 69/2025) *introduce la figura del commissario e misure operative in ambito ambientale, tra cui interventi sulla “Terra dei fuochi”.*
- Il **D.L. 8 agosto 2025, n. 116** (conv. in L. 147/2025) è invece focalizzato sul contrasto ai reati ambientali nel settore dei rifiuti.

Prevede azioni straordinarie contro traffici illeciti e roghi tossici, con rafforzamento dei controlli e delle sanzioni. Stanzia risorse per la bonifica della “Terra dei fuochi” e per la rimozione dei rifiuti abbandonati. Introduce misure organizzative e finanziarie per accelerare gli interventi di risanamento ambientale. Prevede anche interventi di protezione civile e sostegno alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

I due decreti risultano quindi complementari infatti il primo agisce sul sistema amministrativo, il secondo sul contrasto operativo ai fenomeni ambientali illeciti.

Il ruolo e i compiti del Commissario Unico

Il Commissario Unico ha ricevuto l'incarico (D. L. n. 25 del 15.03.2025) di coordinare gli interventi necessari per rispondere alla sentenza CEDU. Le sue attività principali includono:

- **Ricognizione:** Analisi degli interventi già effettuati e delle risorse disponibili.
- **Operatività:** Perimetrazione dei siti contaminati e realizzazione delle bonifiche e messe in sicurezza.
- **Monitoraggio:** Controllo sanitario della popolazione e tutela dei prodotti agricoli.
- **Trasparenza:** Obbligo di informazione pubblica e relazioni mensili per il primo anno di attività.

Le quattro macro-categorie di intervento

L'azione commissariale si concentra su **quattro pilastri fondamentali**:

1. **Terreni agricoli:** Valutazione della qualità dei suoli per garantire cibi sicuri.
2. **Rifiuti in superficie:** Interventi contro gli sversamenti abusivi e i roghi.
3. **Bonifica discariche:** Recupero tecnico dei siti contaminati secondo le norme ambientali.
4. **Salute pubblica:** Azioni di prevenzione per i residenti.

Note metodologiche

- **Collaborazione:** La relazione nasce dall'analisi di oltre 1.000 documenti e note provenienti da enti pubblici, associazioni e cittadini.
- **Esclusioni:** I siti di interesse nazionale (SIN) di **Bagnoli e Napoli Orientale** non sono inclusi nel documento, poiché gestiti da commissari specifici e da Invitalia.
- **Aggiornamento:** Il monitoraggio prevede relazioni mensili per tutto il primo anno di mandato, successivamente la relazione di sintesi avrà cadenza trimestrale.

SUNTO STRUTTURATO DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA, RIMOZIONE RIFIUTI E MONITORAGGIO AMBIENTALE E SANITARIO NELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA (DAL MARZO 2025 AD APRILE 2026)

1. TERRENI AGRICOLI

L'intervento si concentra su circa **1.500 ettari** di terreni agricoli a rischio:

- **Indagini:** 957 ettari sono già sotto analisi, mentre 670 restano da indagare. 110 ettari risultano attualmente interdetti. L'attività di campo con sopralluoghi e analisi chimico-fisiche e radiometriche dei terreni è eseguita da ARPAC con il supporto dei Carabinieri Forestali.

2. RIFIUTI SVERSATI ABUSIVAMENTE SU TERRENI E ASSI VIARI

Come richiesto da Decreto si sono immediatamente avviate le procedure per il censimento delle aree di abbandono di rifiuti al fine di caratterizzarle e procedere poi ai relativi rimozioni e smaltimenti:

Commissario Unico alle Bonifiche delle discariche

DOSSIER performance annuale – 2025>26

- **Censimento siti:** Sono stati individuati **356 siti di abbandono** rifiuti, concentrati quasi equamente tra Caserta (52%) e Napoli (48%).
- **Rimozione operativa:** Al 1° aprile 2026 sono state smaltite circa **2.500 tonnellate** di rifiuti pari a **5.250 metri cubi** di rifiuti rimossi da **58 siti**. Nello specifico il **focus territoriale di alcuni interventi rilevanti**:
 - **Provincia di Caserta:** Interventi rilevanti a Capua (Cava Purgatorio), Casal di Principe e Villa di Briano.
 - **Città Metropolitana di Napoli:** Focus su Pianura (Discarica Senga da 23,6 mln €), Ercolano (Villa Favorita), Caivano, Pozzuoli (aree ex Dep. Pol) e Napoli città (Chiaiano e Gianturco).

3. GARE D'APPALTO E RISPARMI

È stata aggiudicata una gara da **16,5 milioni di euro** per la cernita, rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati, suddivisa in tre lotti. Grazie a un ribasso del 25%, sono stati **risparmiati circa 5,5 milioni** rispetto alla base d'asta iniziale.

Sono inoltre in **fase di preparazione** o valutazione **gare relative a**:

- pulizia di assi viari (4 milioni €).
- indagini geologiche (6 milioni €).
- analisi chimico-fisiche sui terreni (4 milioni €).

4. PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ILLEGALITÀ

L'attività di controllo del territorio è massiccia, supportata anche dall'acquisto di 40 telecamere fornite ai Carabinieri Forestali:

- **Controlli:** Oltre 46.000 persone e 21.000 veicoli ispezionati.
- **Sanzioni e Arresti:** 48 arresti, 1.410 denunce e sequestri di attività per un valore di circa **204 milioni di euro**. Le sanzioni amministrative superano i 6 milioni di euro.

5. BONIFICHE E SALUTE PUBBLICA

Oltre alla rimozione degli smaltimenti abusivi, il piano di bonifica si concentra su determinati siti rilevanti e che da anni abbisognano di bonifica, nello specifico:

- **Bonifiche:** Il Commissario coordina o attua interventi su **20 siti critici**, con attività di caratterizzazione già avviate e, in alcuni casi, lavori di bonifica in corso. Con riferimento ad alcuni **Siti Prioritari e Grandi Bonifiche** che richiedono investimenti massicci a causa della loro complessità:
 - ✓ Maddaloni (Cava Monti): 20 milioni € (2025).
 - ✓ Calvi Risorta (Ex Pozzi Ginori): ~12,7 milioni € (2025).
 - ✓ Area Vasta Lo Uttaro (CE): ~35 milioni € totali tra il 2025 e il 2027.
 - ✓ Villa Literno: Oltre 30 milioni € ripartiti tra diverse discariche (Cuponi, Masseria Annunziata, ex Mirabella).
- **Sanità:** Vengono eseguiti **20.000 controlli oncologici mensili**. È in corso l'integrazione dei database di ASL, ARPAC e Istituto Zooprofilattico per armonizzare i dati sanitari mentre uno studio epidemiologico è stato affidato all'Istituto Superiore di Sanità.

6. STRUMENTI TECNOLOGICI E GOVERNANCE

Per garantire trasparenza è stata implementata la piattaforma **SYNERGIA** (architettura geo-informatica per la ricerca ambientale). Nonché vengono coordinate **attività informative** (sul **sito istituzionale del Commissario** e sul su una pagina appositamente creata sul **portale di ISPRA**) e pubblicate con cadenza quotidiana informazioni per il tramite del sito istituzionale: *oltre 70 notizie pubblicate, 12 interviste, 20 pagine dedicate con oltre 40 mappe, elenchi e cartine di dettaglio*.

E' stata creata ad hoc un'area del sito **MAPPA ITALIA.NET** dove verificare gli andamenti delle lavorazioni del Commissario sulle aree censite e di interesse (con oltre 200 pubblicati, 900 foto e 300 schede specifiche) https://www.mappaitalia.net/landfills/site/index.php/site/home_napoli_caserta.

Il **10 marzo 2026** Il Viceministro dell'Ambiente Gava, insieme al Commissario Gen. D. Vadalà, ha presentato al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un **aggiornamento sulle azioni del Governo per affrontare le criticità della Terra dei Fuochi**. Le **28 delegazioni intervenute hanno espresso apprezzamento** per la partecipazione diretta di un rappresentante di Governo e per la rapidità degli interventi adottati, dalla nomina del Commissario straordinario alla definizione di un piano d'azione complessivo in meno di un anno.

Commissario Unico alle Bonifiche delle discariche

DOSSIER *performance annuale – 2025>26*

7. GOVERNANCE, PROTOCOLLI E DIDATTICA

Il Commissario ha attivato una rete di collaborazioni con enti nazionali e locali per gestire l'emergenza ambientale su più fronti:

- **Tecnologia e monitoraggio:** Sottoscritti accordi con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e in definizione con AGEA e INGV per l'uso di dati satellitari e supporto tecnico nell'individuazione di criticità.
- **Salute e ambiente:** Accordo siglato con l'Istituto Superiore di Sanità per indagini epidemiologiche e con il Polieco per il recupero dei rifiuti plastici agricoli.
- **Legalità e sicurezza:** Protocollo con la Procura e Camera di Commercio di Napoli per prevenire infiltrazioni criminali negli appalti e con ANAS per il contrasto all'abbandono dei rifiuti sulle strade.
- **Educazione e supporto:** In corso la formalizzazione con l'Ufficio Scolastico Regionale (educazione ambientale), le Prefetture di Napoli e Caserta la sigla di un protocollo didattico con l'obiettivo della "*Cultura della Legalità Ambientale*", sulla base di differenti valenze:
 - **Prevenzione:** Educare le nuove generazioni a non sversare rifiuti e a riconoscere gli illeciti riduce la probabilità di futuri reati ambientali.
 - **Restituzione del Territorio:** Mostrare agli studenti che una discarica può essere gestita in sicurezza o che un terreno della "Terra dei Fuochi" può tornare agricolo, serve a combattere la rassegnazione e il senso di abbandono.
 - **Trasparenza (Open Data):** Insegnare ai ragazzi come leggere i dati sui monitoraggi dell'aria o delle falde acquifere rende la popolazione più consapevole e meno soggetta a fake news o allarmismi infondati.

NUMERI E DATI (dal marzo 2025 ad aprile 2026)

➤ OPERATIVI SUL CAMPO

- Terreni agricoli a rischio: 1500 ettari
- Rifiuti sversati rimossi: 2500 ton (oltre 5.300 m3)
- Censimento di aree di sversamento abusive: oltre 350
- Arresti inerenti le attività illecite sui rifiuti (da parte delle FF.PP. territoriali): 48
- Denunce inerenti le attività illecite sui rifiuti (da parte delle FF.PP. territoriali): 1400
- Screening sanitari seguiti (dalle ASL del territorio): 20.000 ogni mese

➤ ECONOMICI

- Valori sequestri sul territorio inerenti le attività abusive legate ai rifiuti (da parte delle FF.PP. territoriali): oltre € 204 mil
- Fondi investiti per le gare per la rimozione dei rifiuti: € 16 mil
- Risparmio sulle gare: € 5.5 mil

➤ ACCOUNTABILITY

- Riunioni di vertice del Commissario: 95
- Riunioni operative e tecniche dei subcommissari e/o esperti: 24
- Incontri istituzionali: 146
- Sopralluoghi specialistici sui siti: 235

➤ COMUNICAZIONE

- Audizione annuale presso il Consiglio D'Europa in merito alla sentenza CEDU: 1
- Eventi e convegni: 38
- Partecipazione ad eventi stampa: 22
- Incontri didattici con le scuole: 5
- Siti dedicati: 8 siti istituzionali dedicati alla terra dei fuochi di cui 3 istituti e gestiti dal Commissario
- Relazioni mensili: 10
- Pagine stampa e online redatte dalla struttura commissariale: 119
- Foto e grafici tecnici dei siti: oltre 1200
- Schede tecniche dei siti realizzate: 400
- Mappe delle aree individuate con cadenza delle operazioni: 120



COMMISSARIO UNICO ALLE BONIFICHE: NUMERI E DATI SULLAMMISSIONE DELLA TERRA DEI FUOCHI

(dal Marzo 2025 ad Aprile 2026)



OPERATIVI SUL CAMPO	ECONOMICI	ACCOUNTABILITY	COMUNICAZIONE
Terreni agricoli a rischio 1500 ettari	Valori sequestri sul territorio inerenti le attività abusive legate ai rifiuti oltre € 204 mil	Riunioni di vertice del Commissario 95	Audizione annuale presso il Consiglio D'Europa in merito alla sentenza CEDU 1
Rifiuti sversati rimossi 2500 ton (oltre 5.300 m3)	Fondi investiti per le gare per la rimozione dei rifiuti € 16 mil	Riunioni operative e tecniche dei subcommissari e/o esperti 24	Eventi e convegni 38
Censimento di aree di sversamento abusive oltre 350	Risparmio sulle gare € 5.5 mil	Incontri istituzionali 146	Partecipazione ad eventi stampa 22
Arresti inerenti le attività illecite sui rifiuti (da parte delle FFPP. territoriali) 48		Sopralluoghi specialistici sui siti 235	Incontri didattici con le scuole 5
Denunce inerenti le attività illecite sui rifiuti (da parte delle FFPP. territoriali) 1400			Siti dedicati 8 siti istituzionali dedicati alla terra dei fuochi di cui 3 istituti e gestiti dal Commissario
Screening sanitari seguiti (dalle ASL del territorio) 20.000 ogni mese			Relazioni mensili 10
			Pagine stampa e online redatte 119
			Foto e mappe dei siti oltre 1200
